PREFEITURA MUNICIPAL DE Rodeiro

# CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO
## COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL - JOSÉ BERNARDES FERREIRA

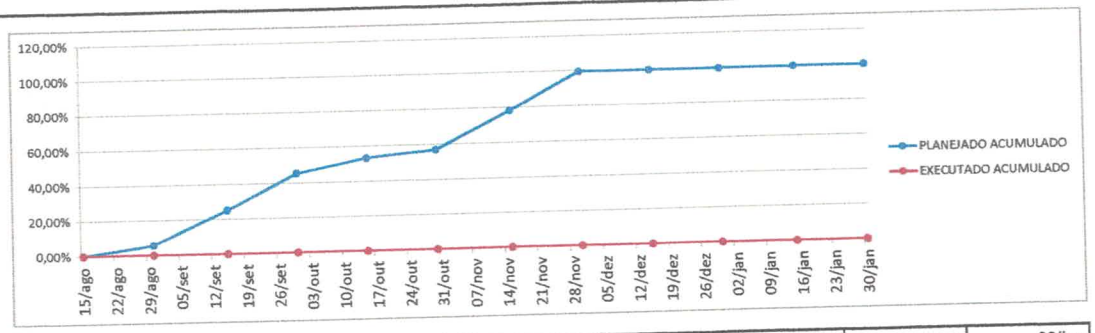


| INÍCIO (O.S.) | 15/ago | 30/ago | 15/set | 30/set | 15/out | 30/out | 15/nov | 30/nov | 15/dez | 30/dez | 15/jan | 30/jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO |
| MARCOS REALIZADOS | 15/ago | | | | | | | | | | | |
| % EXECUTADO NO PERÍODO | 0,00% | | | | | | | | | | | |
| MARCOS PLANEJADOS | 15/ago | 30/ago | 15/set | 30/set | 15/out | 30/out | 15/nov | 30/nov | 15/dez | 30/dez | 15/jan | 30/jan |
| PLANEJADO ACUMULADO | 0,00% | 5,72% | 25,02% | 45,46% | 53,13% | 56,90% | 78,21% | 99,47% | 99,47% | 99,47% | 99,74% | 100,00% |
| EXECUTADO ACUMULADO | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| PLANEJADO MENSAL | 0,00% | 5,72% | 19,30% | 20,44% | 7,67% | 3,78% | 21,31% | 21,26% | 0,00% | 0,00% | 0,26% | 0,26% |
| DIFERENÇA ENTRE O PLANEJADO E O EXEC | 0,00% | | | | | | | | | | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | R$ | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | R$ 11.076,10 | 553,81<br>5,00% | 1.107,61<br>10,00% | 1.661,42<br>15,00% | 1.661,42<br>15,00% | 1.661,42<br>15,00% | 1.107,61<br>10,00% | 1.107,61<br>10,00% | - | - | 1.107,61<br>10,00% | 1.107,61<br>10,00% | 100% |
| 2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ 7.761,59 | 3.104,64<br>40,00% | 2.328,48<br>30,00% | 2.328,48<br>30,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
| 3.0 | FUNDAÇÃO | R$ 0,00 | -<br>40,00% | -<br>30,00% | -<br>30,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
| 4.0 | PAREDES / REVESTIMENTOS | R$ 0,00 | - | - | - | -<br>30,00% | -<br>30,00% | -<br>40,00% | - | - | - | - | - | 100% |
| 5.0 | PINTURA | R$ 38.538,00 | 1.926,90<br>5,00% | 3.853,80<br>10,00% | 7.707,80<br>20,00% | 11.561,40<br>30,00% | 13.488,30<br>35,00% | - | - | - | - | - | - | 100% |
| 6.0 | ESTRUTURA METÁLICA (REFORMA) | R$ 177.137,80 | - | - | - | - | - | 88.568,90<br>50,00% | 88.568,90<br>50,00% | - | - | - | - | 100% |
| 7.0 | MÃO DE OBRA | R$ 185.293,20 | 18.529,32<br>10,00% | 74.117,28<br>40,00% | 74.117,28<br>40,00% | 18.529,32<br>10,00% | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
| 8.0 | INSUMOS | R$ 1.945,75 | - | - | 389,15<br>20,00% | 583,73<br>30,00% | 778,30<br>40,00% | 194,58<br>10,00% | - | - | - | - | - | 100% |
| | TOTAL DA OBRA s/ BDI | R$ 421.752,44 | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DA OBRA c/ BDI | R$ 536.216,05 | | | | | | | | | | | | |
